Acquito sedi dei centri per l'impiego e degli sportelli del lavoro nei Comuni di Terni e Perugia - IPOTESI CON LAVORAZIONI

REGIONE UMBRIA, ARPAL UMBRIA, ATER UMBRIA

Inizio progetto: Tue, 12/10/2021

Visualizza settimana: 1

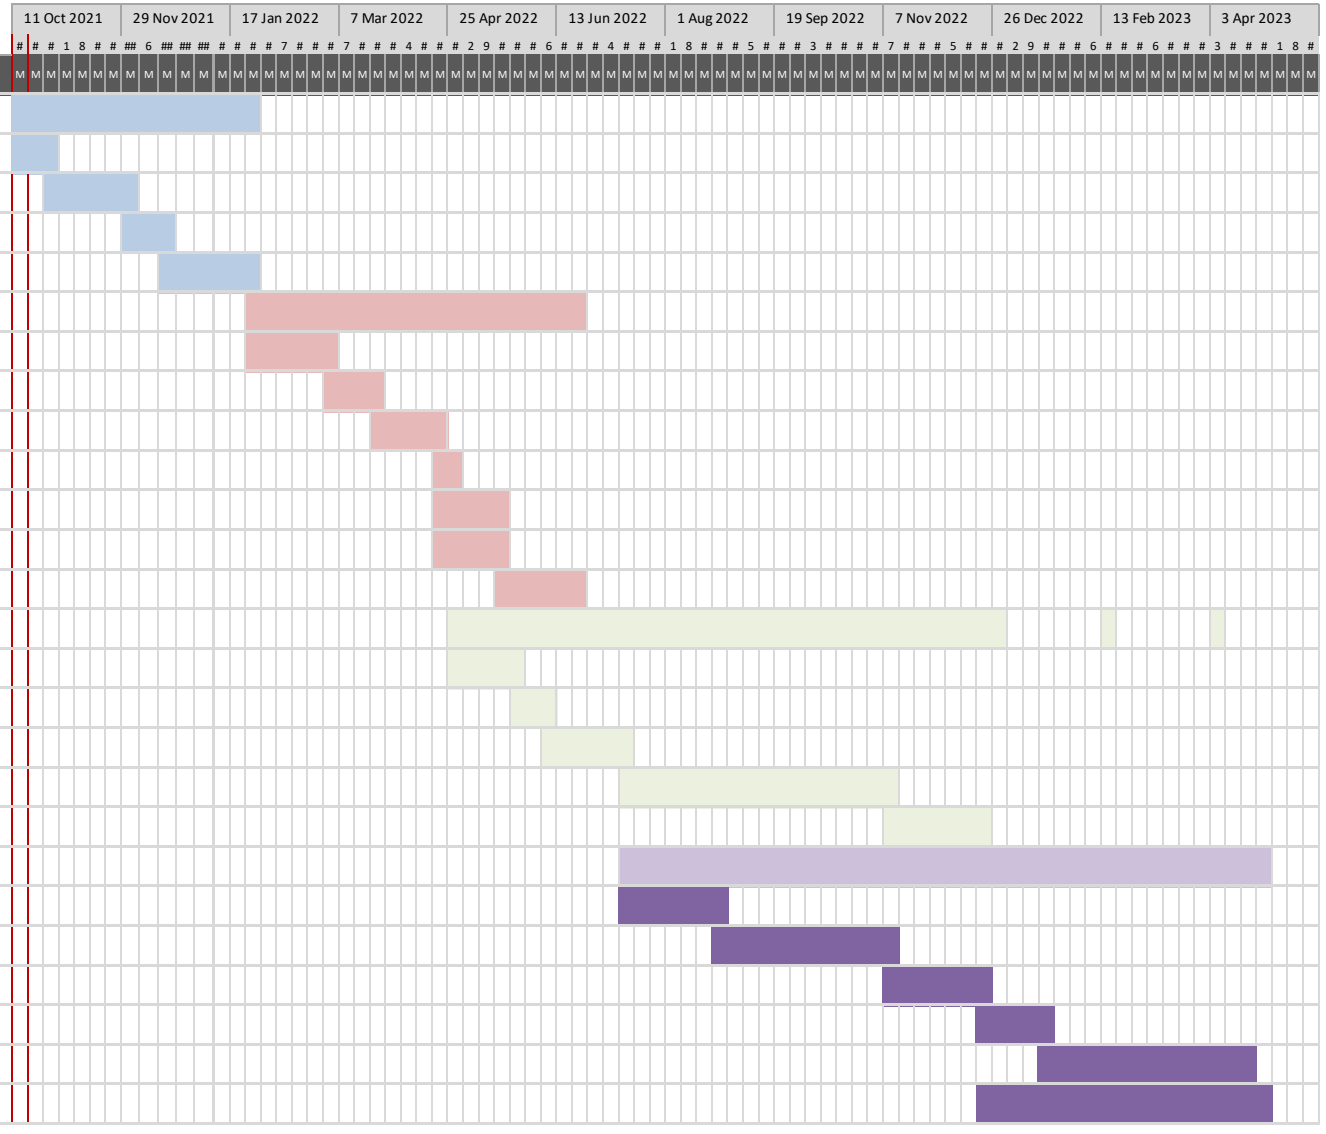

ATTIVITÀ	ASSEGNATO A	AVANZAMENTO	INIZIO	FINE
Titolo fase 1 CONVENZIONE E BANDO		**5%**	**1/8/21**	**29/1/22**
Definizione e approvazione convenzione	Regione, ARPAL, ATER	35%	1/8/21	31/10/21
Predisposizione bozza AVVISO per edifici	ATER	0%	31/10/21	30/11/21
Condivisione bozza AVVISO con Referenti	Referenti	0%	30/11/21	15/12/21
Pubblicazione AVVISO	ATER	0%	15/12/21	29/1/22
Titolo fase 2 Analisi offerte e scelta EDIFICI		**0%**	**29/1/22**	**20/6/22**
presa visione e analisi offerte	ATER	0%	29/1/22	28/2/22
Sopralluoghi per verifica offerte	Referenti	0%	1/3/22	22/3/22
Redazione verbale analisi offerte	ATER	0%	22/3/22	21/4/22
Invio Verbale	ATER	0%	21/4/22	21/4/22
Attività Ammnistrativa Regione Umbria	REGIONE	0%	21/4/22	21/5/22
Attività Ammnistrativa ARPAL Umbria	ARPAL	0%	21/4/22	21/5/22
Sottoscrizione Atto di Compravendita	Regione, ARPAL, ATER	0%	21/5/22	20/6/22
Titolo fase 3 LAVORI di adegamento funzionale		**0%**	**26/4/22**	**23/12/22**
Redazione progetto esecutivo	ATER	0%	26/4/22	27/5/22
Condivisione progetto esecutivo LAVORI	Referenti	0%	27/5/22	10/6/22
Procedura per determinazione opertaore economico	ATER	0%	11/6/22	11/7/22
Inizio e fine lavori	ATER	0%	11/7/22	8/11/22
Collaudo e certificazioni	ATER	0%	8/11/22	23/12/22
Titolo fase 4 Acquisto ARREDI		**0%**	**11/7/22**	**30/4/23**
Redazione capitolato ARREDI	ATER	0%	11/7/22	25/8/22
Condivisione capitolato	Referenti	0%	25/8/22	8/11/22
Procedura per determinazione operatore economico	ATER	0%	8/11/22	23/12/22
Sottoscrizione contratto	ARPAL	0%	23/12/22	22/1/23
Fornitura Arredi	ATER	0%	22/1/23	22/4/23
Trasloco arredi esistenti e uffici	ATER	0%	23/12/22	30/4/23
